



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الموارد المائية والري والكهرباء



وحدة تنفيذ السدود

الإدارة العامة لحصاد المياه

الملخص العام لتنفيذ المشروعات

للعام (2016)


الملخص العام لتنفيذ المشروعات (سدود – حفائر – آبار)

- i. إكتمل تنفيذ عدد 5 سدود (3 سدود خطة + تأهيل 2 سد ملحقات الخطة).
- ii. ، يجري تنفيذ عدد 8 سدود (عدد 2 سد خطة + 4 سدود ملحقات للخطة).
- iii. إكتمل حفر عدد 120 حفير ويجري تنفيذ عدد 6 حفائر بنسب إنجاز متقدمة. أكتمل حفر عدد 232 بئر ، جاري تنفيذ عدد 12 بئر.

❖ النسبة المئوية للإنجاز لخطة العام 2016 بلغت حوالي 90%

❖ كمية المياه المتوقع حصادها هذا العام تقدر بحوالي 35.7 مليون متر مكعب

نسبة الإنجاز التراكمي	موقف التنفيذ				المخطط	المشروع	الرقم
	عوائق	لم يبدأ	جاري	مكتمل			
81%		0	2	3	5	سدود	1
88%	3	8	9	120	140	حفائر	2
100%		0	12	232	200	آبار	3

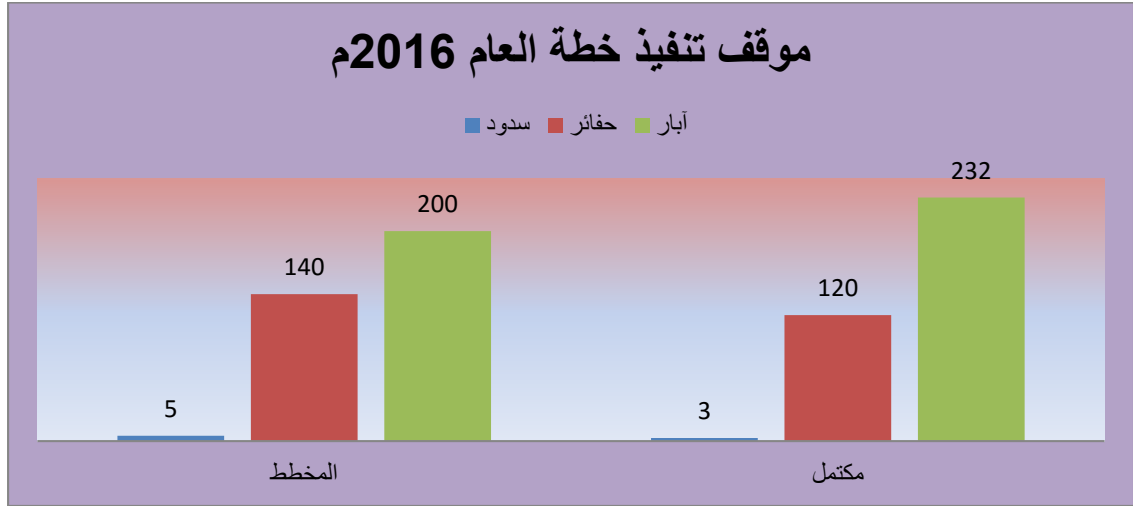

ملخص السدود

I - سدود مكتملة التنفيذ (5).

- سدود الخطة (3).
- سدود ملحقة للخطة (2) (تأهيل سدود توطين النازحين (إزالة أطماء).

II - سدود تحت التنفيذ (6)

- سدود الخطة عدد 2 سد
- سدود ملحقة للخطة 4 (سدود توطين النازحين)

III - الدراسات

- سدود مكتملة الدراسة 13
- سدود تحت الدراسة 15

سدود مراجعة التصميم 7

النسبة الكلية التراكمية للإنجاز لخطة العام 2016م بالنسبة للسدود حوالي 81%.

الجملة الكلية لساعات السدود (تنفيذ + تأهيل) حوالي 14.175 مليون متر مكعب

مشروعات السدود 2016م (الخطة + مشاريع ملحقة للخطة)

الرقم	اسم السد	القطاع	الولاية	المحلية	السعة التخزينية (م ³)	نسبة الإنجاز	ملاحظات
1	تنفيذ سد أركويت 2	الشرق	البحر الأحمر		590,000	100%	مشروعات الخطة
2	تنفيذ سد هندوب			سواكن	2,035,000	100%	مشروعات الخطة
3	تنفيذ سد قديت			هيا	8,400,000	100%	مشروعات الخطة
4	تأهيل سد أبو قمر	دارفور	شمال دارفور	كرنوي	3,000,000	100% إزالة أطماء 118,000 م ³	تأهيل سدود لمشروع توطين النازحين (ملحقة للخطة)
5	تأهيل سد شعيرية		شرق دارفور	شعيرية	150,000	100% إزالة أطماء 95,000 م ³	
					14,175,000	الجملة الكلية لسعات السدود	

- ملخص الحفائر

ملخص خطة العام 2016 للحفائر

خطة العام 2016 تشمل تنفيذ عدد (140) حفير ودراسة وتصميم عدد (300) حفير .

- تم تنفيذ عدد 120 حفير .
- جاري تنفيذ عدد 6 حفير بنسب إنجاز متقدمة.
- عدد 11 حفير لم يبدأ بها العمل.
- عدد 3 حفائر بها عوائق (مشاكل امنية + إعتراض).


❖ النسبة الكلية التراكمية للإنجاز لخطة العام 2016م بالنسبة للحفائر حوالي **88%**.

❖ السعة المتوقع حصدها عبر مشروعات الحفائر حوالي **7.15** مليون متر مكعب.

جدول يوضح مشروعات الحفائر ونسب الإنجاز

خطة العام 2016	مخطط	مكتمل	قيد التنفيذ	الانجاز الشهري	الانجاز التراكمي
تشيد حفائر	140	120	6	%5	%88
دراسة وتصميم	300	80	104	%5	%26
الجملة	452	196	113	%7	%60

مخطط يوضح موقف تنفيذ خطة العام 2016م بالنسبة للحفائر

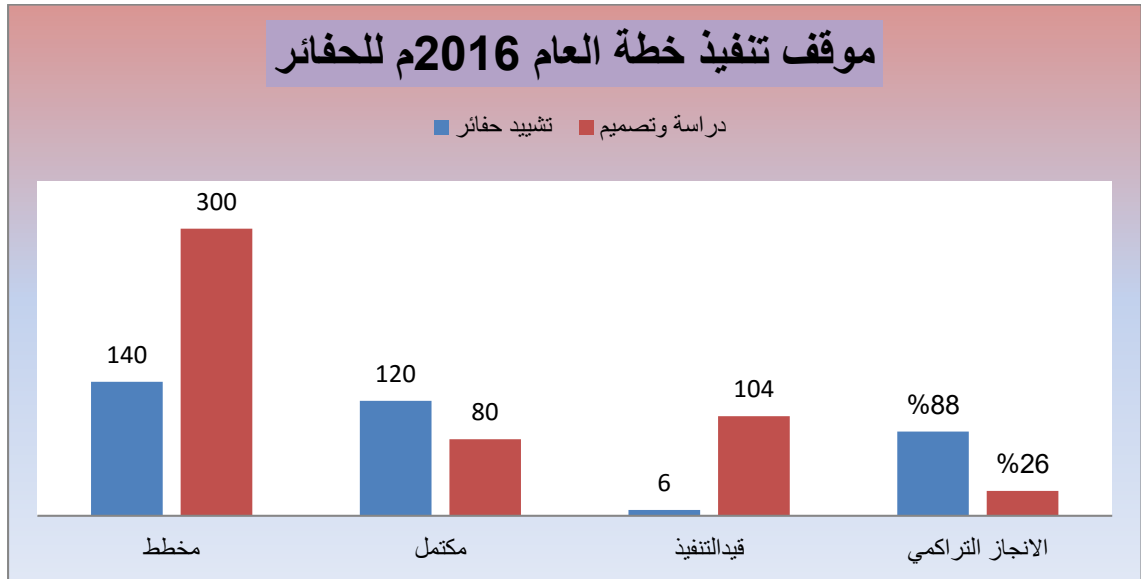

2.1.3- ملخص الآبار

- تم حفر عدد 232 بئر.
- جاري العمل في حفر عدد 12 بئر.
- إكتمل تركيب عدد 4 محطات.
- جاري العمل في تركيب عدد 17 محطة.
- تم إكمال الدراسات الجيوفيزيائية لعدد 87 بئر

النسبة الكلية التراكمية للإنجاز لخطة العام 2016م بالنسبة للحفائر بلغت **100%**.

❖ تم حفر عدد 200 بئر في مختلف ولايات السودان وبجملة إنتاج سنوي يقدر بحوالي
14,400,000 م³

مخطط يوضح موقف تنفيذ خطة العام 2016م للآبار

